


Информационная справка за 4 квартал 2025г. по проекту:

Комплексные работы по строительству "под ключ". "Реконструкция электрических кабельных сетей напряжением 6-10кВ от ТЭЦ-1 РЭС-1 по г.Алматы, Алмалинский, Жетысуйский, Ауэзовский район". 1-я, очередь

Приобретены следующие материалы:

- Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ, 3х240/25 (мк)-10/АХАЛ-ТТ рго - 3325,2 м.
- Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией: 1421 XR/ID, 1422 XR/ID, 1425 XR/ID - 291 шт.
- Маркероискатель 1420E EMS-ID - 1шт.
- Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, УФ НГ DN/OD 132 - 1228,26 м

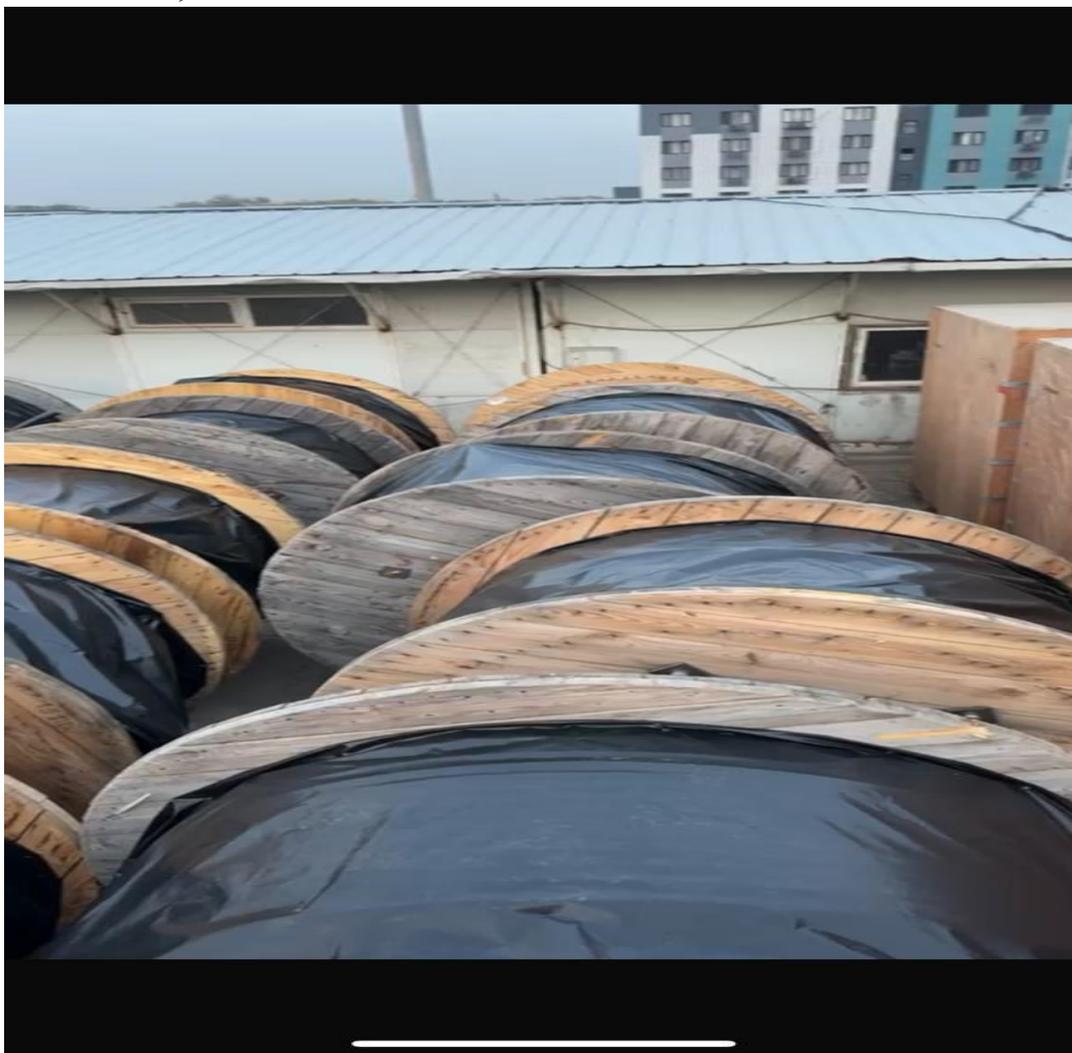

Кабель силовой находится на складе у производителя ТОО «КазЭлектроМаш» по адресу: г.Семей, Северный промузел, д.14А.







Труба ВКТС находится на складе у производителя ТОО «Завод
Высокопрочных Кабельных Труб» по адресу: Алматинская область, Байсерке
ул. Султана Бейбарыса 5, ИЛЦ «Даму-Алматы».

Комплексные работы по строительству "под ключ". "Реконструкция электрических кабельных сетей напряжением 6-10кВ от ТЭЦ-1 РЭС-1 по г.Алматы, Алмалинский, Жетысуйский, Ауэзовский район". 2-я очередь

Приобретены следующие материалы:

- Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки AL/XLPE Sta/PE Smart Power HV 3x240/25-10 - 1793,77м.



Кабель силовой находится на складе у производителя ТОО «КазЭлектроМаш» по адресу: г.Семей, Северный промузел, д.14А.

Комплексные работы по строительству "под ключ". "Реконструкция электрических кабельных сетей напряжением 6-10кВ от ТЭЦ-1 РЭС-1 по г.Алматы, Алмалинский, Жетысуйский, Ауэзовский район". 3-я очередь

Приобретены следующие материалы:

- Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки AL/XLPE Sta/PE Smart Power HV 3x240/25-10 - 3335,502м



Кабель силовой находится на складе у производителя ТОО «КазЭлектроМаш» по адресу: г.Семей, Северный промузел, д.14А.

Комплексные работы по строительству "под ключ". "Реконструкция электрических кабельных сетей напряжением 6-10кВ от ТЭЦ-1 РЭС-1 по г.Алматы, Алмалинский, Жетысуйский, Ауэзовский район". 4-я очередь

Приобретены следующие материалы:

- Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки AL/XLPE Sta/PE Smart Power HV 3x240/25-10 - 1 444,932м



Кабель силовой находится на складе у производителя ТОО «КазЭлектроМаш» по адресу: г.Семей, Северный промузел, д.14А.

Комплексные работы по строительству "под ключ". "Реконструкция электрических кабельных сетей напряжением 6-10кВ от ТЭЦ-1 РЭС-1 по г.Алматы, Алмалинский, Жетысуйский, Ауэзовский район". 5-я очередь

Приобретены следующие материалы:

- Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки AL/XLPE Sta/PE Smart Power HV 3x240/25-10 - 1 989,204м



Кабель силовой находится на складе у производителя ТОО «КазЭлектроМаш» по адресу: г.Семей, Северный промузел, д.14А.

Комплексные работы по строительству "под ключ". "Реконструкция электрических кабельных сетей напряжением 6-10кВ от ТЭЦ-1 РЭС-1 по г.Алматы, Алмалинский, Жетысуйский, Ауэзовский район". 6-я очередь

Приобретены следующие материалы:

- Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки AL/XLPE Sta/PE Smart Power HV 3x240/25-10 - 1 729,159м.

Кабель силовой находится на складе у производителя ТОО «КазЭлектроМаш» по адресу: г.Семей, Северный промузел, д.14А.

